

Manual de Rotinas e Procedimentos da Diretoria de Obras (DIROB) – EMOP-RJ

Sep 19, 2026 · Minuta v0.2 para validação da Diretoria de Obras

1. Que documento é este e como usar

O instrumento adequado não é um POP único, e sim um conjunto em três níveis: um Manual de Rotinas (este documento), um POP por processo e Instruções de Trabalho com o clique a clique dos sistemas. Um POP sozinho descreve bem uma tarefa, mas não diz quem faz o quê na Diretoria nem o que vence a cada dia, semana e mês.

Nível	Nome	Pergunta que responde	Exemplo na DOB	Quem aprova
1	Manual de Rotinas (MAN-DOB-001)	Quem faz o quê, quando e com base em qual norma?	Seções 2, 3, 4 e 7 deste documento	Diretor de Obras, com publicação no BOE
2	Procedimento Operacional Padrão (POP-DOB-nn)	Como o processo anda de ponta a ponta, entre funções e unidades?	POP-DOB-04 Medição mensal	Diretor de Obras
3	Instrução de Trabalho (IT-DOB-SEI-nn)	Onde clico e o que preencho?	IT-DOB-SEI-06 Enviar documento para assinatura do Diretor	Gerente ou Assessor responsável
Apoio	Formulários e checklists (FRM-DOB-nn)	O que preciso conferir ou preencher?	Checklist de instrução de medição	Gerente ou Assessor responsável

Por que esse formato. É o mesmo desenho usado por quem já faz isso bem:

- O Tribunal de Justiça do RJ separa a rotina administrativa (RAD, com responsabilidades e fluxo) do plano de atividade detalhada (PAD, com o passo a passo) e dos formulários. Há uma RAD específica para medição em contratos de obras, a [RAD-SGLOG-084](#), que serviu de referência de estrutura.

- O próprio órgão gestor do SEI-RJ publica um POP por operação (atribuir processo, elaborar CI, assinar, enviar via bloco de assinatura), na página de [manuais do Portal SEI-RJ](#).
- O departamento de transportes da Califórnia organiza seu [Construction Manual](#) por responsabilidade de cada função, com formulários numerados, tabela de guarda de registros e um aviso formal a cada revisão.
- A ISO 9001 pede exatamente essa hierarquia de informação documentada: política, procedimento, instrução e registro.

Validade formal. O Regimento Interno da EMOP (disposições finais) determina que toda norma de serviço para implantação de rotina de trabalho seja publicada no Boletim Oficial da EMOP (BOE). O mesmo Regimento dá à Assessoria da DOB a atribuição de sugerir instruções, normas e fluxogramas (Subseção III, VII). O caminho natural é: a Assessoria ou a Gerência elabora, o Diretor aprova, publica-se no BOE.

Como ler, se você acabou de chegar.

1. Leia na Seção 3 o quadro da sua função.
2. Imprima ou fixe o calendário da Seção 4. Ele diz o que vence hoje, nesta semana e neste mês.
3. Quando um evento acontecer (chegou contrato novo, chegou medição, pediram aditivo), abra o POP correspondente no Anexo A.
4. Para qualquer dúvida de tela do SEI-RJ, vá à Seção 6.


Controle de versões. Cada documento leva código, número da revisão, data, quem elaborou e quem aprovou. Revisão ordinária uma vez por ano e revisão extraordinária sempre que mudar o Regimento, o Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) ou o fluxo de assinatura. A versão válida é sempre a que está no processo SEI do próprio manual; cópia impressa é só consulta.

Esta é a versão 0.2, montada a partir do Estatuto (2019), do Regimento Interno (abril de 2018), dos dois rascunhos já iniciados pelo Diretor (V3 e V5) e de pesquisa externa. Os trechos marcados com **[VALIDAR]** dependem de confirmação da prática atual da EMOP e estão reunidos na Seção 8.

2. Estrutura da DOB e base normativa

Pelo Regimento Interno de 2018, a Diretoria de Obras (sigla atual DIROB; o Regimento de 2018 ainda traz DOB) tem 4 Coordenadorias de Obras, 8 Departamentos de Obras e uma Assessoria. Cada Coordenadoria (COBRA) tem dois Departamentos (DOBRA), e cada

Departamento é chefiado por um Gerente. A fiscalização de cada contrato é feita por comissão designada pelo Diretor-Presidente, por indicação do Diretor de Obras.

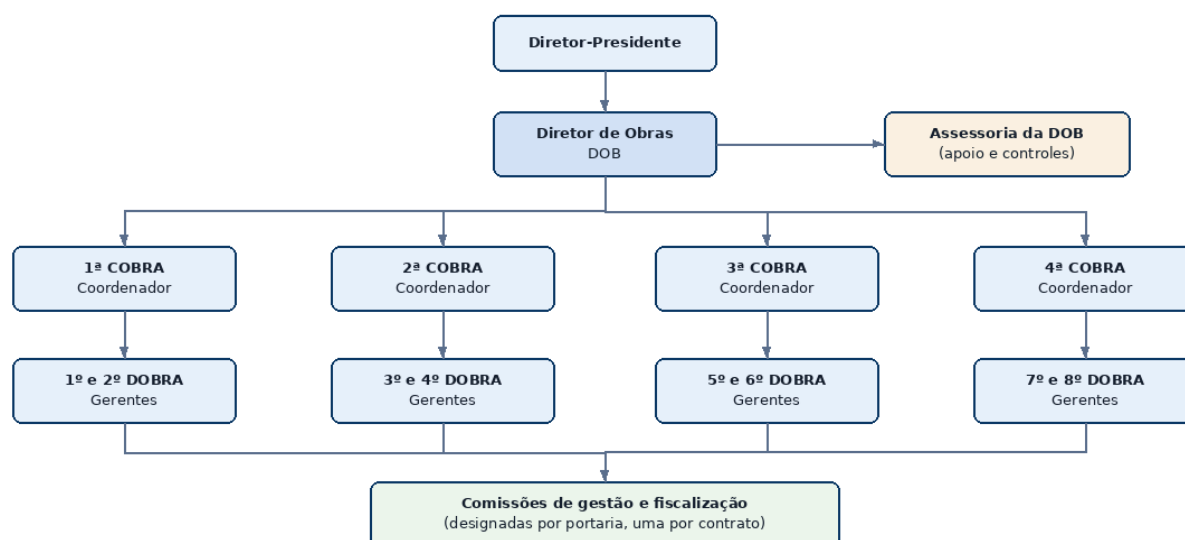

O desenho acima é o regimental. **[VALIDAR]** Os rascunhos V3 e V5 citam uma "Gerência Técnica Administrativa, Financeira e de Planejamento" ligada direto ao Diretor, que não existe com esse nome no Regimento; pelas tarefas descritas, ela exerce o papel que o Regimento dá à Assessoria (Subseção III). Este manual trata as duas como a mesma unidade de apoio até confirmação.

Divergências entre os rascunhos, já resolvidas pelo Regimento.

Ponto	V3	V5	Adotado aqui	Fonte
Sigla da Diretoria	DOB	DIROB	DOB	Orientação atual da Diretoria; o Regimento de 2018 traz DOB
Nome do DOBRA	Departamento de Obras	Departamento Regional de Obras	Departamento de Obras	Regimento, Cap. II, itens 4.1.1 a 4.4.2
Quem expede o Memorando de Início	Gerência administrativa elabora, Diretor aprova	Gerente	Gerente expede (Subseção II, XII); Coordenador coordena e controla (Subseção I, XIII)	Regimento, Seção VIII

Ponto	V3	V5	Adotado aqui	Fonte
Significado de RIPM	Relatório de Instrução de Processo de Modificação	Realinhamento de Itens de Planilha de Medição	[VALIDAR]	Não consta do Regimento
Significado de BCO	Boletim de Cadastro de Obras	Boletim de Controle de Ocupação	[VALIDAR] (o contexto indica cadastro de obras)	Não consta do Regimento

Normas que regem a DOB, da mais geral para a mais específica.

Norma	O que importa para a rotina da DOB
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)	Regime de licitação e contratos da EMOP. Contratos da EMOP seguem esta lei e o RLC próprio, não a Lei 14.133/2021, salvo onde o RLC remeter a ela.
Decreto estadual 46.188/2017	Regulamenta a Lei das Estatais no RJ. Exige banco de dados eletrônico de licitações e contratos com acesso em tempo real aos órgãos de controle (art. 44) e publicidade da execução dos contratos (art. 46).
Lei 6.404/1976	Deveres e responsabilidades do Diretor como administrador.
Estatuto Social (2019), art. 43	Quatro competências do Diretor de Obras: dirigir a fiscalização e o gerenciamento; controle físico-financeiro; fornecer informações para relatórios; administrar o relacionamento com clientes e contratadas.
Estatuto Social, art. 38, parágrafo único	A Empresa só se obriga com a assinatura de 2 Diretores, ou de 1 Diretor e 1 procurador. Nenhum documento que crie obrigação sai só com a assinatura do Diretor de Obras.
Estatuto Social, art. 40, XII e art. 41, VIII	Contratos e atos que criem obrigação financeira são assinados pelo Diretor-Presidente com o Diretor de Administração e Finanças.

Norma	O que importa para a rotina da DOB
Regimento Interno (2018), Seção VIII	Atribuições do Diretor (I a VII), do Coordenador (31 incisos), do Gerente (31 incisos) e do Assessor (27 incisos). É a base da Seção 3 deste manual.
Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP (RLC)	Arts. 213 a 216 tratam da comissão de gestão e fiscalização, conforme as portarias publicadas nos Boletins de Serviço. [VALIDAR] texto integral não obtido; juntar ao processo deste manual.
Manual de Fiscalização da EMOP	Citado pelo Regimento como referência do Coordenador e atualizado pela Assessoria (Subseção III, XVIII). [VALIDAR] versão vigente.
Decreto estadual 48.209/2022	Regras de uso do SEI-RJ, inclusive o dever de verificar diariamente os processos pendentes.
Deliberações TCE-RJ 280/2017, 281/2017 e 312/2020	Envio de contratos, aditivos e editais ao Tribunal pelo SIGFIS e pelo e-TCERJ. [VALIDAR] com a Auditoria quais remessas cabem à DOB e quais à DAF.

Unidades com que a DOB fala todo dia.

Sigla	Unidade	Para quê
PRES / GAPRE	Presidência e Gabinete	Designação de comissões, autorização de aditivos, publicações
ASJUR / COJUR	Assessoria Jurídica e Coordenadoria Jurídica e de Compliance	Parecer em aditivos, penalidades e rescisões
DAF / DEFIN	Diretoria de Administração e Finanças e Departamento Financeiro	Empenho, liquidação, pagamento, programação de desembolso (PD)
DPP / DEORC	Diretoria de Planejamento e Projetos e Departamento de Orçamento de Obras	Projetos, orçamentos, preços novos em aditivos, relatório de fim de obra
AUDIT	Auditoria Interna	Respostas a órgãos de controle
Órgão cliente	Secretaria ou entidade dona do prédio	Liberação de frentes, recebimento, recursos

3. Atribuições e rotinas por função

Cada quadro abaixo traduz os incisos do Regimento em tarefas concretas, com periodicidade e evidência. "RI" é o Regimento Interno de 2018, Seção VIII; "ES" é o Estatuto Social de 2019. A evidência é o que prova, numa auditoria, que a tarefa foi feita.

3.1 Diretor de Obras

Dirige, coordena e controla a execução de todas as obras gerenciadas pela EMOP, por meio dos órgãos subordinados (RI, I). Decide, assina e representa a Diretoria; não instrui processo.

Tarefa	Quando	Evidência	Base
Despachar e assinar o que a equipe sinalizou como pronto (ver IT-DOB-SEI-06)	Diária, em dois horários fixos (sugestão: 10h e 16h)	Documentos assinados no SEI	ES art. 43, I
Ler o resumo de pendências críticas preparado pela Assessoria	Diária	Anotação ou e-mail de resumo	RI, I

Tarefa	Quando	Evidência	Base
Reunião de coordenação com os 4 Coordenadores: prazos, medições, aditivos, riscos	Semanal	Ata curta no processo de gestão da DOB	RI, V
Reunião de Diretoria: levar demandas da DOB e relatório atualizado das obras	Mensal, ou quando convocada (ES art. 37)	Relatório mensal da DOB	RI, IV
Validar o relatório mensal da Diretoria elaborado pela Assessoria	Mensal, até o 5o dia útil	Relatório assinado	RI Subseção III, III
Indicar ao Diretor-Presidente os membros da comissão de gestão e fiscalização de cada contrato	Por evento (contrato novo ou substituição)	Despacho de indicação no SEI	RLC arts. 213 a 216; RI Subseção I, XXIX
Decidir sobre encaminhamento de aditivos, prorrogações e penalidades propostos pelos Coordenadores	Por evento	Despacho decisório	ES art. 43, II e IV
Articular com outras Diretorias e órgãos clientes	Contínua	Ofícios, atas	RI, III
Encaminhar à DPP, ao fim de cada obra, o dossiê de encerramento (orçamento inicial, cronograma, prazo real, acumulado medido, as built)	Por evento (obra recebida)	Despacho de envio à DPP	RI, VI
Propor à Presidência e à COARH o plano de capacitação da equipe técnica	Anual, com revisão semestral	Plano de capacitação	RI, II

Tarefa	Quando	Evidência	Base
Avaliar o desempenho das chefias e empregados sob sua supervisão	Anual	Avaliação registrada	RI, atribuições comuns aos Diretores, III
Aprovar revisões deste manual e do Manual de Fiscalização	Anual ou por evento	Aprovação e publicação no BOE	RI Subseção III, XVIII

O Diretor assina sozinho: despachos, encaminhamentos internos, indicações de comissão, aprovações técnicas no âmbito da DOB. **Não assina sozinho** nada que obrigue a Empresa perante terceiros (ES art. 38, parágrafo único).

3.2 Coordenador de Obras (1a a 4a COBRA)

Coordena e padroniza as ações de Gerentes e fiscais da sua Coordenadoria. É o filtro técnico entre o Departamento e o Diretor: tudo o que sobe ao Diretor passa antes pelo visto do Coordenador.

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção I)
Verificar a caixa SEI da COBRA e redistribuir ou despachar	Diária	Processos atribuídos	Decreto 48.209/2022
Vistar e atestar planilhas de medição e anexos (memória de cálculo, relatório fotográfico, mapa de tempo) vindos dos Gerentes	Mensal, na janela de medição	Visto no SEI	XXIII, XVIII
Exigir que a última medição represente no mínimo 10% do valor do contrato e só seja autorizada após o Termo de Recebimento Provisório	Por evento (reta final da obra)	Despacho de conferência	XVII
Reunião com Gerentes e fiscais da Coordenadoria	Semanal	Ata curta	XII
Reunião com os demais Coordenadores para padronizar procedimentos	Mensal	Ata curta	XI

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção I)
Acompanhar cronograma, empenho, medições, memorandos, prorrogações, modificações de quantidades, penalidades e recebimentos de cada obra	Semanal	Painel de obras atualizado	VIII
Controlar a expedição de Memorando de Início e Reinício	Por evento	Visto no memorando	XIII
Informar e justificar pedidos de adequação ou prorrogação de cronograma	Por evento	Justificativa técnica	XIV
Coordenar proposição e justificativa de modificação de quantidades e serviços novos	Por evento	Justificativa técnica	XV
Coordenar advertências e proposição de multas	Por evento	Proposta de penalidade	XVI
Informar necessidade de suplementação de recursos à Assessoria e à DAF	Mensal, ou ao detectar	Despacho	XIX
Avaliar o desempenho das contratadas	Mensal e ao fim da obra	Ficha de desempenho	XX
Definir com o Diretor e os demais Coordenadores os nomes para a fiscalização	Por evento	Indicação	XXIX
Colaborar nas respostas a TCU, TCE, MPF, MPE	Por evento, com prazo do órgão	Minuta de resposta	XXVI
Coordenar o recolhimento do acervo de fim de obra (manuais, garantias, as built) e enviar ao cliente e à Assessoria	Por evento	Termo de entrega	XXIV
Apresentar status das obras	Mensal ou sob demanda	Apresentação	XXVIII

3.3 Gerente de Obras (1o ao 8o DOBRA)

Planeja, coordena e supervisiona a execução das obras do seu Departamento. É quem instrui os processos: monta, confere e deixa pronto para visto do Coordenador e decisão do Diretor.

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção II)
Abrir o SEI, tratar processos em vermelho (não lidos), atribuir a si ou ao fiscal, anotar providência	Diária, início do expediente	Atribuição e anotação no SEI	Decreto 48.209/2022
Falar com cada fiscal sobre ocorrências do dia anterior e conferir o Diário de Obras	Diária	Diário de Obras em dia	III, XXVIII
Conferir prazos que vencem em 30, 15 e 7 dias: vigência do contrato, prazo de execução, garantia, ART	Semanal	Planilha de prazos	V
Visitar as obras do Departamento	Semanal ou quinzenal, conforme o porte	Relatório de visita com fotos	XXVIII
Reunião de obra com a contratada e o representante do órgão cliente; ajustar o programa de execução e a liberação de frentes	Semanal ou quinzenal	Ata de reunião	X, IX
Controlar ou executar a medição; atestar planilha e anexos	Mensal	Medição atestada no SEI	XVIII, XX
Elaborar o Relatório Mensal de Obras do Departamento	Mensal, até o 3o dia útil	Relatório	III, g

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção II)
Expedir Memorando de Início ou Reinício	Por evento	Memorando assinado	XII
Informar e justificar prorrogação ou adequação de cronograma	Por evento, antes do fim do prazo vigente	Justificativa	XIV
Instruir modificação de quantidades e serviços novos	Por evento	Planilha comparativa e justificativa	III, e
Aplicar advertência e propor multa, quando atuar como fiscal	Por evento	Notificação	XVI
Propor uso ou inclusão de consultoria técnica quando a qualidade ou a segurança exigir	Por evento	Proposta	XVII
Organizar a documentação técnica da obra (projetos, revisões, ensaios, pareceres)	Contínua	Pasta da obra completa	VII
Enviar ao apoio administrativo cópia de CIs, ofícios, aditivos, diário, termos e publicações	Contínua	Arquivo da DOB atualizado	VIII
Gerenciar Recebimento Provisório e Definitivo	Por evento	Termos assinados	XXVI
Recolher o acervo de fim de obra e enviar os dados ao Coordenador	Por evento	Dossiê de encerramento	XXI, XXII
Colaborar nas respostas a órgãos de controle	Por evento	Minuta	XXIII
Avaliar e capacitar os subordinados	Anual e contínua	Avaliação	Atribuições comuns, VI e VIII

3.4 Assessoria da DOB (apoio técnico, administrativo, financeiro e de planejamento)

Assessora o Diretor e mantém os controles da Diretoria inteira. É a "torre de controle": não fiscaliza obra, mas sabe a situação de todas.

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção III)
Triar a caixa SEI da DOB, separar o que é para assinatura do Diretor, preparar resumo	Diária, antes dos horários de despacho	Bloco ou marcador de assinatura preenchido	I; atribuições dos Assistentes
Ler o Diário Oficial: liberações orçamentárias, extratos de aditivos, portarias de comissão; juntar cópia ao processo	Diária	Publicação juntada	XX
Ler o e-mail institucional e classificar por prioridade (Presidência, órgãos de controle, clientes)	Diária	Caixa de entrada tratada	Rascunho V3, POP-06
Controlar o fluxo de medições, modificações, prorrogações, aditivos e termos de recebimento	Semanal	Planilha de fluxo	IX
Controlar entrega de documentos pela fiscalização e avisar Coordenadores e Gerentes dos atrasos	Semanal	Relatório de pendências	XVII
Conferir os dados lançados na Caderneta do Fiscal	Semanal	Registro de conferência	XV
Conferir e atualizar SGP e demais bancos de dados das obras	Semanal	Sistema atualizado	XIX, XXI; rascunho V3, POP-01

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção III)
Controlar saldo de empenho por obra e informar desembolso à DAF	Mensal, e a cada medição	Planilha de saldos	X
Controlar emissão e pagamento das PDs	Mensal	Controle de PDs	XXVI
Controlar cauções e seguros-garantia; pedir endosso quando houver aditivo de prazo ou valor	Mensal, e por evento	Controle de garantias	XXV
Elaborar o relatório mensal da Diretoria	Mensal, até o 5o dia útil	Relatório	III
Elaborar gráficos, quadros e demonstrativos para decisão	Mensal	Painel	XI
Controle de frequência do pessoal administrativo	Mensal	Folha de frequência	XVI
Abrir processo de realinhamento contratual e instruir até a liberação do recurso	Por evento	Processo SEI	XXII
Cadastrar obra nova (código de obra, boletim de cadastro)	Por evento	Cadastro	Rascunho V3, POP-03 [VALIDAR]
Controlar viaturas, equipamentos e inventário de mobiliário	Mensal; inventário anual	Quadro de controle	XII, XIII
Consolidar o dossiê de fim de obra para envio à DPP	Por evento	Dossiê	XIV
Coletar dados para a proposta orçamentária anual	Anual	Proposta	VI

Tarefa	Quando	Evidência	Base (RI Subseção III)
Elaborar o relatório anual da Diretoria	Anual, até janeiro	Relatório	III
Atualizar o Manual de Fiscalização com Coordenadores e Gerentes	Anual ou por evento	Revisão aprovada	XVIII
Consolidar a escala de férias da DOB garantindo cobertura da fiscalização	Anual, com ajuste mensal	Escala	Rascunho V3, POP-06

3.5 Comissão de gestão e fiscalização do contrato

É designada por portaria do Diretor-Presidente, por indicação do Diretor de Obras, com base nos arts. 213 a 216 do RLC da EMOP. Representa a EMOP no canteiro. **[VALIDAR]** composição e divisão de papéis (gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo) conforme o texto do RLC.

Tarefa	Quando	Evidência
Ler edital, contrato, projeto, planilha e cronograma antes do início	Uma vez, antes do Memorando de Início	Ciência no processo
Conferir ART ou RRT de execução, matrícula da obra, seguros, placa, plano de segurança	Antes do início	Checklist de início
Fiscalizar a execução, a qualidade dos materiais e a segurança do trabalho	Diária ou conforme plano de visitas	Diário de Obras
Registrar no Diário de Obras: efetivo, clima, serviços, ocorrências, determinações	Diária	Diário assinado pelas duas partes
Exigir e conferir ensaios de controle tecnológico	Conforme o serviço	Laudos na pasta da obra
Levantar quantidades, montar memória de cálculo, relatório fotográfico e mapa de tempo	Mensal	Boletim de medição

Tarefa	Quando	Evidência
Comunicar ao Gerente, por escrito, atraso, não conformidade ou fato que exceda sua competência	Imediata	CI ou despacho
Notificar a contratada e propor advertência ou multa	Por evento	Notificação com prazo
Vistoriar para Recebimento Provisório e listar pendências	Fim da obra	Termo de Recebimento Provisório
Conferir as built, manuais e garantias	Fim da obra	Acervo entregue

3.6 Apoio administrativo (Assistentes e secretaria)

Tarefa	Quando	Base
Controlar a tramitação dos processos na unidade e a entrada e saída de expediente	Diária	RI, atribuições dos Assistentes, I e VI
Controlar a agenda do gestor e alertar compromissos	Diária	II
Preparar correspondências e expedientes	Diária	VII
Manter arquivo de cópias e arquivo virtual organizado, com cópia de segurança	Semanal	III e IV
Propor melhorias nos procedimentos	Contínua	VIII

3.7 Substituições

Toda rotina tem titular e substituto treinado. Na ausência do Diretor, outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente assume as atribuições (ES art. 36, § 3o). Para as demais funções, o substituto deve constar de quadro próprio, atualizado pela Assessoria junto com a escala de férias. O rascunho V3 já trazia um quadro nominal; ele entra como anexo, para que troca de pessoas não exija revisão do manual.

4. Calendário de rotinas

Este é o quadro para fixar na parede: reúne, por periodicidade, o que a Seção 3 distribuiu por função. Os dias do mês são sugestões de partida **[VALIDAR]**; o que importa é que cada Diretoria fixe datas e as cumpra.

4.1 Todo dia

Horário sugerido	O quê	Quem
Início do expediente	Abrir o SEI, tratar processos em vermelho, atribuir e anotar providência	Todos que têm caixa (DOB, COBRA, DOBRA)
Início do expediente	Ler Diário Oficial e e-mail institucional; juntar publicações aos processos	Assessoria
Início do expediente	Conferir ocorrências do dia anterior no Diário de Obras	Gerente com cada fiscal
Até 9h30 e até 15h30	Fechar a lista do que está pronto para assinatura do Diretor	Assessoria
10h e 16h	Despacho e assinatura	Diretor
Fim do expediente	Conferir se o que foi assinado já foi enviado à unidade seguinte; nada assinado dorme na caixa	Assessoria e Gerentes
No canteiro	Fiscalizar e registrar o Diário de Obras	Fiscalização

4.2 Toda semana

Dia sugerido	O quê	Quem
Segunda	Reunião de coordenação: Diretor com os 4 Coordenadores e a Assessoria (30 a 45 min, pauta fixa: prazos, medições, aditivos, riscos, órgãos de controle)	Diretor
Segunda ou terça	Reunião de cada Coordenador com seus Gerentes e fiscais	Coordenador

Dia sugerido	O quê	Quem
Terça a quinta	Visitas às obras e reuniões com contratada e órgão cliente	Gerente e fiscalização
Quinta	Conferir planilha de prazos: tudo que vence em 30, 15 e 7 dias	Gerente; Assessoria consolida
Sexta	Atualizar SGP e bancos de dados; conferir Caderneta do Fiscal; emitir relatório de pendências de documentos	Assessoria
Sexta	Limpeza da caixa SEI: concluir na unidade o que não tem mais providência; conferir Retornos Programados e Controles de Prazo	Todos que têm caixa

4.3 Todo mês

Janela sugerida	O quê	Quem
Conforme o contrato (em regra a cada 30 dias do Memorando de Início)	Levantamento de campo e boletim de medição	Fiscalização
Até 3 dias úteis após o fechamento	Atesto da medição pelo Gerente	Gerente
Até 2 dias úteis depois	Visto do Coordenador e envio à DOB	Coordenador
Até 2 dias úteis depois	Conferência de saldo de empenho e envio à DAF	Assessoria e Diretor
Até o 3o dia útil	Relatório Mensal de Obras de cada Departamento	Gerente
Até o 5o dia útil	Relatório mensal da Diretoria, com painel e indicadores	Assessoria, validado pelo Diretor
Até o 5o dia útil	Atualização dos sistemas de controle externo [VALIDAR] prazo e responsável com a Auditoria	Assessoria

Janela sugerida	O quê	Quem
Mensal	Reunião entre os 4 Coordenadores para padronização	Coordenadores
Mensal	Controle de garantias, PDs, viaturas e frequência	Assessoria
Mensal	Ficha de desempenho das contratadas	Coordenador
Mensal	Reunião de Diretoria Executiva	Diretor

4.4 Todo trimestre

O quê	Quem	Base
Insumos da DOB para o relatório trimestral da área de conformidade e riscos	Assessoria	ES art. 72, IX
Revisão da matriz de riscos das obras em andamento	Coordenadores	ES art. 35, XVI
Revisão das metas da Diretoria pactuadas com o Conselho	Diretor	Decreto 46.188/2017, art. 35
Revisão do quadro de substitutos	Assessoria	Seção 3.7

4.5 Todo ano

Quando	O quê	Quem
Janeiro	Relatório anual da Diretoria	Assessoria e Diretor
Conforme calendário da DAF	Proposta orçamentária da Diretoria	Assessoria
Até a última reunião ordinária do Conselho no ano	Insumos para o plano de negócios e metas do ano seguinte	Diretor
Anual	Escala de férias com cobertura da fiscalização	Assessoria


Quando	O quê	Quem
Anual	Inventário de equipamentos e mobiliário	Assessoria
Anual	Plano de capacitação	Diretor
Anual	Avaliação de desempenho	Diretor, Coordenadores, Gerentes
Anual	Treinamento obrigatório de administradores (código de conduta, controle interno, Lei 12.846/2013)	Diretor (ES art. 26)
Anual	Revisão deste manual e do Manual de Fiscalização	Assessoria, aprovado pelo Diretor

4.6 Por evento

Evento	Procedimento
Contrato novo chegou à DOB	POP-DOB-01
Tudo pronto para começar a obra	POP-DOB-02
Rotina de fiscalização em campo	POP-DOB-03
Fechou o período de medição	POP-DOB-04
Prazo não vai dar, ou falta ou sobra quantidade, ou surgiu serviço novo	POP-DOB-05
Obra precisa parar, ou pode voltar	POP-DOB-06
Contratada descumpriu obrigação	POP-DOB-07
Obra terminou	POP-DOB-08
Chegou ofício de órgão de controle	POP-DOB-09
Trocou fiscal, gerente ou coordenador	POP-DOB-10

5. Procedimentos operacionais: visão geral

Dez procedimentos cobrem a vida de um contrato dentro da DOB, do dia em que ele chega até o recebimento definitivo. Cada um está no Anexo A, em folha própria, e diz o gatilho, quem conduz, o passo a passo e o que sai no fim. Os passos feitos no SEI remetem às instruções da Seção 6.

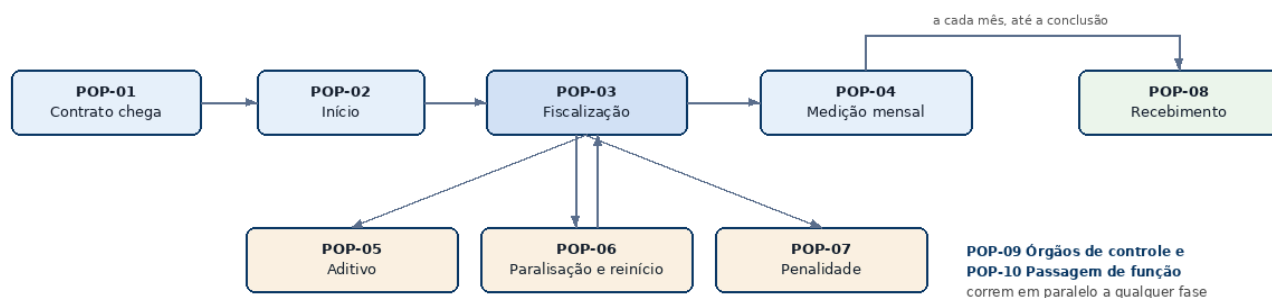

Os POPs 09 (órgãos de controle) e 10 (troca de responsável) correm em paralelo a qualquer fase.

Código	Procedimento	Gatilho	Quem conduz
POP-DOB-01	Receber contrato novo e preparar a obra	Contrato assinado chega à DOB pelo SEI	Assessoria, com o Coordenador
POP-DOB-02	Emitir Memorando de Início	POP-01 concluído	Gerente, sob controle do Coordenador
POP-DOB-03	Fiscalizar a obra	Memorando de Início	Comissão de fiscalização, supervisionada pelo Gerente
POP-DOB-04	Medição mensal	Fechamento do período de medição	Fiscal, Gerente, Coordenador, Diretor
POP-DOB-05	Aditivos: prazo, quantidades e serviços novos	Necessidade de alterar prazo, quantidade ou serviço	Gerente, Coordenador, Assessoria, Diretor
POP-DOB-06	Paralisação e reinício	Fato que impede a continuidade da obra	Gerente, com controle do Coordenador
POP-DOB-07	Penalidades	Descumprimento contratual registrado	Fiscal, Gerente, Coordenador

Código	Procedimento	Gatilho	Quem conduz
POP-DOB-08	Recebimento provisório, definitivo e encerramento	Contratada comunica a conclusão	Gerente
POP-DOB-09	Responder a órgãos de controle	Ofício, citação ou diligência	Assessoria, com Gerente e Coordenador
POP-DOB-10	Passagem de função	Troca de fiscal, Gerente, Coordenador ou Assessor	Quem sai, com o superior imediato

6. SEI-RJ na Diretoria de Obras

A resposta curta para "como o Diretor sabe que está pronto para assinar": tudo que é para ele assinar entra num Bloco de Assinatura atribuído a ele, e só entra depois de conferido. O Diretor abre um único lugar, vê a fila, lê o resumo e assina tudo de uma vez. O resto desta seção organiza a caixa da Diretoria em volta dessa ideia e dá o clique a clique.

Fonte de tudo que segue: [Manual do Usuário Interno do SEI-RJ](#), versão 4.0, mantido pela Coordenadoria de Gestão do SEI-RJ, e o [manual federal de Blocos](#). As telas reais estão nesses links, seção por seção. **Sobre as imagens:** as nove telas desta seção são esquemáticas, desenhadas para treinamento, com os pontos de clique numerados; não são capturas do sistema. A Seção 8 explica como trocá-las por capturas reais da EMOP.

6.1 Os combinados da DOB

1. Todo mundo que tem caixa abre o SEI no início do expediente. É dever previsto no Decreto 48.209/2022.
2. Processo em vermelho (não lido) não passa do meio-dia sem dono: ou é atribuído, ou é devolvido.
3. Todo processo aberto na unidade tem três coisas: uma pessoa atribuída, um marcador de situação e uma anotação dizendo a próxima providência.
4. Documento para assinatura do Diretor só entra no bloco depois de conferido por quem responde por ele (Gerente, Coordenador ou Assessor), que marca o bloco como Revisado.
5. Nada assinado dorme na caixa: assinou, enviou no mesmo dia.
6. Todo envio que espera resposta sai com Retorno Programado.
7. Processo sem providência pendente na unidade é concluído na unidade. Caixa cheia esconde o que é urgente.

8. Ordem, orientação ou autorização que gere custo ou prazo só vale por documento no SEI. Mensagem de aplicativo não é ato administrativo.

6.2 Como ler a tela Controle de Processos

SEI-RJ Pesquisar... **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Controle de Processos

Receber Atribuir Marcador Acomp. Especial Incluir em Bloco Enviar Anotação Incluir Doc. Concluir

Ver processos atribuídos a mim | Ver por marcadores | Ver por tipo de processo | Visualização detalhada

Recebidos

- ☐ SEI-170002/001234/2026
- ☐ SEI-170002/001198/2026 (ederson.antonio) **MEDICÃO**
- ☐ SEI-170002/000987/2026 (maria.souza) **PARA ASSINATURA DO DIRETOR**
- ☐ SEI-170002/000951/2026 (ederson.antonio) **PRAZO EXTERNO**
- ☐ SEI-170002/000903/2026 (joao.lima) **AGUARDANDO TERCEIRO**

Gerados

- ☐ SEI-170002/001240/2026 (ederson.antonio)

1 Menu principal: Iniciar Processo, Blocos, Marcadores, Controle de Prazos, Painel
 2 Unidade em que você está. Clique para trocar (DOB, COBRA, DOBRA)
 3 Barra de ícones: marque a caixinha do processo e clique na ação
 4 Filtros: só os meus processos, por marcador, por tipo
 5 Número em VERMELHO = ninguém abriu ainda. Abrir, atribuir, anotar
 6 Login = a quem está atribuído. Etiqueta colorida = marcador de situação

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

O que você vê	O que significa	O que fazer
Número do processo em vermelho	Ninguém da unidade abriu ainda	Abrir, atribuir, anotar
Número em preto	Já foi aberto por alguém da unidade	Seguir a anotação
Número em azul	Você mexeu nele nesta sessão	Nada
Nome entre parênteses ao lado	Pessoa a quem está atribuído	Se for você, é seu
Ícone de exclamação	Documento novo foi incluído ou assinado	Abrir e ver o que chegou
Ícone de anotação amarelo	Tem anotação	Passar o mouse para ler
Ícone de anotação vermelho	Anotação com prioridade	Tratar primeiro
Etiqueta colorida	Marcador da unidade	Ver 6.3

O que você vê	O que significa	O que fazer
Relógio de Retorno Programado	Outra unidade espera devolução, ou você espera	Ver a data passando o mouse
Ícone de Controle de Prazo	Prazo interno da unidade	Ver a data passando o mouse
Caneta amarela ao lado do documento	Assinado, mas ainda editável (ninguém de fora abriu)	Ainda dá para corrigir
Caneta preta	Assinado e já visto por outra unidade	Não edita mais; só cancela

Colunas: **Recebidos** (veio de outra unidade) e **Gerados** (nasceu aqui). Links úteis logo acima da lista: "Ver processos atribuídos a mim", "Ver por marcadores" e "Visualização detalhada".

6.3 Marcadores padrão da DOB

Marcador é uma etiqueta colorida que só a própria unidade enxerga. Proposta de conjunto único para DOB, COBRAs e DOBRAs **[VALIDAR]** cores disponíveis na versão instalada:

Cor	Nome do marcador	Quer dizer	Quem põe	Quem tira
Vermelho	PRAZO EXTERNO	Órgão de controle, Justiça, Ministério Público	Quem recebe	Quem envia a resposta
Azul	EM ELABORAÇÃO	Alguém está produzindo o documento	Quem atribui	Quem conclui a minuta
Amarelo	PARA ASSINATURA DO DIRETOR	Minuta conferida, já está no bloco	Quem conferiu	Assessoria, após a assinatura
Verde	ASSINADO, ENVIAR	Falta só tramitar	Assessoria	Quem envia
Laranja	AGUARDANDO TERCEIRO	Depende de contratada, cliente ou outra unidade	Quem cobra	Quem recebe a resposta
Roxo	MEDIÇÃO	Processo de medição em curso	Gerente	Assessoria, após envio à DAF

Cor	Nome do marcador	Quer dizer	Quem põe	Quem tira
Cinza	ADITIVO	Alteração contratual em instrução	Gerente	Assessoria, após publicação

No campo de texto do marcador, escreva o complemento curto: "Med. 07 - Escola X", "TCE - vence 30/09".

Para agrupar todos os processos de uma mesma obra (contrato, medições, aditivos, penalidades), use **Acompanhamento Especial** com um grupo por obra. Marcador diz a situação; Acompanhamento Especial diz a qual obra pertence.

6.4 Instruções de trabalho

Cada instrução traz o caminho de cliques. O link ao lado do título abre a seção do manual oficial com as telas.

IT-DOB-SEI-01 Entrar e escolher a unidade ([telas](#))

1. Abra <https://sei.rj.gov.br/sei>.
2. Preencha **Usuário** e **Senha** (os da rede), escolha o **Órgão** e clique em **Acessar**. Também dá para entrar com **gov.br** se o CPF estiver no cadastro.
3. No alto da tela, à direita, aparece a sigla da unidade em que você está. Quem tem acesso a mais de uma (por exemplo DOB e 1a COBRA) clica na sigla e troca.
4. Confira sempre a unidade antes de criar ou assinar documento: o documento nasce na unidade em que você está.

IT-DOB-SEI-02 Receber, atribuir e anotar ([telas](#))

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Processo SEI-170002/001198/2026

1. SEI-170002/001198/2026

- Boletim de Medição 07
- Memória de Cálculo (PDF)
- Relatório Fotográfico (PDF)
- Nota Fiscal 4521 (PDF)
- Atesto - 3º DOBRA
- Despacho DOB (minuta)

2. [» Consultar Andamento](#)

3. **Atribuir**

4. Processo aberto nas unidades: EMOP/DOB (atribuído a ederson.antonio)

5. **Anotações**

6. **Processos Relacionados:**
SEI-170002/000321/2026 (Contrato)

1. Árvore do processo: documentos na ordem de inclusão. Clique para abrir
2. Caneta = assinado. Amarela: ainda editável. Preta: já visto por outra unidade
3. Barra de ícones do processo (muda quando você clica num documento)
4. Onde o processo está aberto e com quem
5. Histórico completo de tramitação
6. Processos relacionados (contrato, medições, aditivos). Um clique abre

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. Na tela **Controle de Processos**, clique no número em vermelho. O SEI registra o recebimento com seu nome e horário.
2. Leia o último despacho na árvore, à esquerda.
3. Volte ao Controle de Processos, marque a caixinha ao lado do número e clique no ícone **Atribuição de Processos** (bonequinho), na barra de ícones.
4. Em **Atribuir para**, escolha a pessoa e clique em **Salvar**. O login dela aparece entre parênteses ao lado do processo.
5. Com o processo aberto, clique no ícone **Anotações** (bloquinho). Em **Descrição**, escreva a próxima providência e o prazo: "Conferir medição 07 até 12/10". Se for urgente, marque **Prioridade**. **Salvar**.
6. Para redistribuir tudo de alguém que saiu: clique no login dele ao lado de qualquer processo; abra a lista de tudo que está com ele; marque, escolha o novo nome, **Salvar**.

IT-DOB-SEI-03 Marcar a situação e agrupar por obra

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Gerenciar Marcador / Anotações

Gerenciar Marcador

1 **Marcador:**
■ PARA ASSINATURA DO DIRETOR ▼

Texto: 2
Med. 07 - Escola X

Salvar

Anotações

3 **Descrição:**
Conferir medição 07 até 12/10. Falta certidão FGTS.

☒ Prioridade 4

Salvar

1 Escolha a situação conforme a tabela 6.3. Só a sua unidade vê
2 Complemento curto: medição, obra, prazo
3 Anotação = próxima providência + prazo. Aparece ao passar o mouse
4 Prioridade deixa o ícone vermelho na lista

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. **Criar os marcadores (uma vez só, por unidade):** Menu principal, **Marcadores**, botão **Novo**. Escolha o **Ícone** (a cor), digite o **Nome** conforme a tabela 6.3 e clique em **Salvar**.
2. **Pôr marcador num processo:** abra o processo, clique no ícone **Gerenciar Marcador** (etiqueta). Escolha o marcador na lista, escreva o **Texto** complementar, **Salvar**.
3. **Trocar ou tirar:** mesmo ícone; escolha outro marcador ou remova.
4. **Ver a caixa por situação:** no Controle de Processos, clique em **Ver por marcadores**. Aparece a contagem por marcador; clique no número para abrir só aqueles.
5. **Agrupar por obra:** abra o processo, clique no ícone **Acompanhamento Especial** (olho). Em **Grupo**, escolha a obra ou clique em **Novo Grupo** e dê o nome ("Contrato 012/2026 - Escola X"). **Salvar**.
6. **Ver tudo de uma obra:** Menu principal, **Acompanhamento Especial**, filtre pelo grupo. O processo aparece ali mesmo que já tenha sido enviado a outra unidade.

IT-DOB-SEI-04 Criar documento a partir de modelo ([telas](#))

A DOB mantém os modelos oficiais (Memorando de Início, despacho de encaminhamento de medição, justificativa técnica, indicação de comissão) num processo-modelo, e cada um é salvo em **Favoritos**.

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Gerar Documento — Despacho

Texto Inicial: ☒ Documento Modelo ☐ Texto Padrão ☐ Nenhum **Selecionar nos Favoritos**

Descrição: Encaminha medição 07 à DAF

Interessados: Construtora Exemplo Ltda.; Secretaria de Estado de Educação

Observações desta unidade:

Nível de Acesso: ☐ Sigiloso ☐ Restrito ☒ Público

Salvar

1 Marque Documento Modelo para partir de um modelo pronto da DOB
 2 Escolha o modelo salvo no grupo "Modelos DOB"
 3 Descrição curta: aparece na árvore ao lado do tipo do documento
 4 Público como regra. Restrito só com hipótese legal
 5 Salvar. Depois: Editar Conteúdo (lápiz), ajustar dados da obra, Salvar

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. **Salvar um modelo (uma vez só):** abra o documento-modelo, clique no ícone **Adicionar aos Favoritos** (estrela). Escolha ou crie o **Grupo "Modelos DOB"**, escreva a **Descrição** e clique em **Salvar**.
2. **Usar o modelo:** no processo da obra, clique em **Incluir Documento** e escolha o **Tipo do Documento** (Despacho, Memorando, Comunicação Interna).
3. Em **Texto Inicial**, marque **Documento Modelo**, clique em **Selecionar nos Favoritos** e escolha o modelo.
4. Preencha **Descrição** ("Encaminha medição 07"), **Interessados**, **Nível de Acesso** e clique em **Salvar**.
5. O documento abre igual ao modelo. Clique em **Editar Conteúdo** (lápiz), ajuste os dados da obra e **Salvar**.
6. Para citar outro documento sem erro de digitação: no editor, use o botão **Inserir link para processo ou documento do SEI** e cole o número do protocolo. O número vira link.

Para trechos repetidos (parágrafo de fecho, fundamento legal), use **Textos Padrão** no menu principal: **Novo**, dê **Nome**, **Descrição**, **Conteúdo**, **Salvar**. No editor, o botão **AutoTexto** insere o trecho.

IT-DOB-SEI-05 Incluir documento externo (PDF, planilha, foto) ([telas](#))

The screenshot shows the 'Registrar Documento Externo' form in the SEI-RJ system. The form is titled 'Registrar Documento Externo' and is located under the 'Controle de Processos' menu. The form fields are as follows:

- Tipo do Documento:** A dropdown menu with 'Planilha' selected. (Annotated with 1)
- Data do Documento:** A date field with '30/09/2026' entered. (Annotated with 2)
- Número / Nome na Árvore:** A text field with 'Medição 07 - Memória de cálculo' entered. (Annotated with 2)
- Formato:** Two radio buttons: 'Nato-digital' (selected) and 'Digitalizado nesta Unidade'. (Annotated with 3)
- Tipo de Conferência (só para digitalizado):** A dropdown menu with 'Documento Original' selected. (Annotated with 4)
- Nível de Acesso:** Three radio buttons: 'Sigiloso', 'Restrito', and 'Público' (selected). (Annotated with 4)
- Escolher arquivo:** A button next to a text field containing 'medicao07_memoria.pdf'. (Annotated with 5)
- Salvar:** A blue button at the bottom of the form.

Below the form, there is a legend for the numbered annotations:

- 1 Tipo mais próximo: Planilha, Relatório, Nota Fiscal, Certidão
- 2 Nome padronizado: "Medição 07 - Memória de cálculo"
- 3 Nato-digital = já nasceu eletrônico. Digitalizado = você escaneou papel
- 4 Se digitalizado: original, cópia simples ou cópia autenticada
- 5 Anexe o arquivo e clique em Salvar

At the bottom of the legend, it states: 'Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.'

1. No processo, **Incluir Documento**, escolha **Externo**.
2. **Tipo do Documento:** o mais próximo (Planilha, Relatório, Nota Fiscal, Certidão). **Data do Documento:** a data que está no papel.
3. **Número / Nome na Árvore:** nome claro e padronizado: "Medição 07 - Memória de cálculo".
4. **Formato:** **Nato-digital** se já nasceu eletrônico (PDF emitido pela contratada, certidão da internet). **Digitalizado nesta Unidade** se você escaneou papel; nesse caso escolha o **Tipo de Conferência** (original, cópia simples, cópia autenticada).
5. **Nível de Acesso, Escolher arquivo, Salvar.**
6. Inclua os anexos da medição sempre na mesma ordem do checklist; quem confere acha tudo no mesmo lugar em qualquer obra.

IT-DOB-SEI-06 Deixar pronto para o Diretor assinar, e como o Diretor assina ([telas](#))

Caso A: o documento foi gerado na unidade DOB (pela Assessoria, em nome do Diretor).

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa
Textos Padrão
Favoritos
Blocos ▶
Marcadores
Acompanhamento Especial
Controle de Prazos
Painel de Controle
Estatísticas

Novo Bloco de Assinatura

Descrição:
PARA ASSINATURA DO DIRETOR - 19/09 manhã

Unidades para Disponibilização:
(em branco = uso interno) | DOB = documento de COBRA/DOBRA para o Diretor

Grupo (opcional):
Assinatura Diretor ▼

Salvar

1 Menu → Blocos → Assinatura → botão Novo
2 Descrição com destino e data: o Diretor bate o olho e entende
3 Caso A (gerado na DOB): deixe em branco. Caso B (COBRA/DOBRA): digite DOB
4 Salvar. Depois inclua os documentos pelo ícone "Incluir em Bloco de Assinatura"

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Blocos de Assinatura

☒ Ver blocos atribuídos a mim Sinalizações: ☐ Prioritários ☐ Revisados ☐ Comentados Estado: ☒ Gerado ☒ Recebido ☐ Concluído

Número	Sinalizações	Atribuição	Estado	Disponibilização	Descrição	Ações
4512	P R C	diretor.obras	Gerado		PARA ASSINATURA DO DI	Docs Assinar Atrib. Ret. Concl.
4498	P R C	diretor.obras	Recebido	EMOP/2COBRA	Justificativa aditivo	Docs Assinar Atrib. Ret. Concl.
4471	P R C		Retornado	EMOP/DOB	Memorando de Início -	Docs Assinar Atrib. Ret. Concl.

Ações: Docs = Processos/Documents do Bloco | Assinar = Assinar Documentos do Bloco | Atrib. = Atribuir Bloco | Ret. = Disponibilizar/Retomar | Concl. = Concluir Bloco

1 Diretor: marque para ver só a sua fila de assinatura
2 P vermelho = prioritário. R azul = REVISADO (pronto). C laranja = tem resumo
3 Bloco atribuído ao Diretor
4 Gerado, Disponibilizado, Recebido, Retornado, Concluído
5 Ler documentos, assinar tudo de uma vez, atribuir, retomar, concluir

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. **Criar o bloco do dia (Assessoria):** Menu principal, **Blocos, Assinatura**, botão **Novo**. Em **Descrição**: "PARA ASSINATURA DO DIRETOR - 19/09 manhã". Deixe **Unidades para Disponibilização** em branco (é uso interno). **Salvar**.

2. **Pôr o documento no bloco (quem fez a minuta):** na árvore do processo, clique no documento; na barra de ícones, clique em **Incluir em Bloco de Assinatura**. Escolha o bloco na lista, marque o documento e clique em **Incluir**.
3. **Conferir (Gerente, Coordenador ou Assessor):** Menu, **Blocos, Assinatura**. Na linha do bloco, clique no ícone **Processos/Documentos do Bloco**, abra cada documento clicando no número e leia.
4. **Sinalizar:** na coluna **Sinalizações** do bloco, clique em **Revisado** (fica azul e grava seu nome, dia e hora). Clique em **Comentário** e escreva o resumo para o Diretor em até três linhas por documento: objeto, valor, o que se pede. Se houver prazo fatal, clique em **Prioritário** (fica vermelho).
5. **Entregar ao Diretor:** na coluna **Ações**, clique em **Atribuir Bloco** e escolha o Diretor. Ponha no processo o marcador amarelo PARA ASSINATURA DO DIRETOR.
6. **O Diretor assina:** Menu, **Blocos, Assinatura**, marca **Ver blocos atribuídos a mim**. Bloco com ícone azul está conferido; com vermelho, é o primeiro. Lê o comentário, abre o que quiser ler inteiro, e clica em **Assinar Documentos do Bloco**. Escolhe o **Cargo/Função**, digita a **Senha**, **Assinar**. Todos os documentos do bloco são assinados de uma vez.
7. **Se o Diretor não concordar:** não assina aquele documento; escreve o motivo no **Comentário** do bloco ou numa **Anotação** no processo. A Assessoria retira o documento do bloco e devolve a quem fez.
8. **Depois da assinatura (Assessoria):** troca o marcador para verde ASSINADO, ENVIAR; envia o processo (IT-07); ao fim do dia, em **Blocos, Assinatura**, clica em **Concluir Bloco**.

Caso B: o documento foi gerado em outra unidade (COBRA ou DOBRA) e precisa da assinatura do Diretor. Pelo SEI, usuário só assina direto documento da própria unidade. Para assinar documento de outra, é obrigatório o bloco disponibilizado.

1. Na unidade de origem: **Blocos, Assinatura, Novo**. Em **Unidades para Disponibilização**, digite **DOB** e selecione. **Salvar**.
2. Inclua o documento no bloco (passo 2 do Caso A) e, na lista de blocos, clique em **Disponibilizar Bloco**. O estado muda para Disponibilizado. Enquanto estiver assim, a origem não edita o documento.
3. Na unidade DOB, o bloco aparece com estado Recebido. A Assessoria confere, sinaliza e atribui ao Diretor (passos 3 a 5 do Caso A).
4. O Diretor assina (passo 6) e a Assessoria clica em **Retornar Bloco**.
5. A origem vê o estado Retornado, confere a assinatura na árvore e dá andamento ao processo.

Regra de ouro: o bloco leva o documento para assinatura, mas não leva o processo. Depois de assinado, alguém ainda precisa enviar o processo (IT-07).

IT-DOB-SEI-07 Enviar o processo ([telas](#))

SEI-RJ **EMOP/DOB** Usuário | Sair

Enviar Processo

Processos:
SEI-170002/001198/2026 - Contrato 012/2026 - Escola X - Medição 07

Unidades:
DAF - Diretoria de Administração e Finanças [Mostrar unidades por onde tramitou](#)

☐ Manter processo aberto na unidade atual
☐ Remover anotação
☐ Enviar e-mail de notificação

Retorno Programado:
☐ Data certa ☒ Prazo em dias ☒ Úteis

Enviar

1 Digite a sigla da unidade de destino e selecione na lista
 2 Atalho para devolver a quem mandou
 3 Só marque se a DOB ainda tiver algo a fazer em paralelo
 4 Espera resposta? Defina prazo. O SEI avisa as duas unidades
 5 Enviar. Confira em Consultar Andamento que o envio foi registrado

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. Confira na árvore se todos os documentos estão assinados (caneta ao lado de cada um).
2. Com o processo aberto, clique no ícone **Enviar Processo** (envelope com seta).
3. Em **Unidades**, digite a sigla de destino. O link **Mostrar unidades por onde tramitou** ajuda a devolver a quem mandou.
4. Marque **Manter processo aberto na unidade atual** só se a DOB ainda tiver algo a fazer em paralelo. Na dúvida, não marque.
5. Se espera resposta, em **Retorno Programado** escolha **Data certa** ou **Prazo em dias**.
6. Clique em **Enviar**. Confira em **Consultar Andamento** que o envio ficou registrado.

IT-DOB-SEI-08 Controlar prazos ([telas](#))

Ferramenta	Serve para	Quem vê
Controle de Prazo	Prazo interno da unidade (responder ao TCE até dia 30)	Só a unidade
Retorno Programado	Cobrar devolução de outra unidade	As duas unidades
Anotação com prioridade	Lembrete visível na lista	Só a unidade

1. **Controle de Prazo:** no processo, ícone **Controle de Prazo** (calendário). Escolha **Data certa** ou **Prazo em dias**, **Salvar**. O ícone aparece na lista; fica vermelho quando vence.
2. **Ver todos:** Menu principal, **Controle de Prazos**. Lista com dias restantes.
3. **Retornos:** Menu principal, **Retorno Programado**. Mostra o que a DOB deve devolver e o que espera de volta.
4. **Concluir o prazo** quando a tarefa for feita, senão o painel fica poluído.

IT-DOB-SEI-09 Assinatura da contratada como usuário externo ([telas](#))

1. O representante da contratada precisa de cadastro de usuário externo aprovado. A orientação está no [Manual do Usuário Externo](#).
2. No documento (termo aditivo, termo de recebimento), clique no ícone **Gerenciar Liberações para Assinatura Externa**.
3. Informe o **E-mail da Unidade**, localize o **Usuário Externo** pelo e-mail cadastrado, marque **Com visualização integral do processo** só se necessário, defina a **Validade** em dias e clique em **Liberar**.
4. A contratada recebe o aviso por e-mail, entra no SEI externo e assina.
5. Confira a assinatura na árvore antes de colher as assinaturas da EMOP, respeitando a ordem do POP-05.

IT-DOB-SEI-10 Corrigir, concluir e achar ([telas](#))

Situação	O que fazer
Errei o texto, caneta ainda amarela	Editar Conteúdo , corrigir, Salvar e assinar de novo
Documento não assinado, ou assinado com caneta amarela, que não devia existir	Ícone Excluir

Situação	O que fazer
Documento já visto por outra unidade (caneta preta)	Ícone Cancelar Documento , com motivo. Na DOB, só com termo de cancelamento assinado por quem pediu (rascunho V3)
Documento entrou fora de ordem	Ícone Ordenar Árvore do Processo
Quero ver o que mudou na minuta	Ícone Versões do Documento , marcar duas, Comparar Versões
Não há mais nada a fazer na unidade	Ícone Concluir Processo . Ele some da lista, mas continua existindo
Preciso de um processo concluído	Pesquisar pelo número, abrir e clicar em Reabrir Processo
Não sei o número	Pesquisa , por Especificação, Interessado, tipo ou texto. Por isso a Especificação tem de ser bem preenchida

Padrão de Especificação na DOB: "Contrato no/ano - Nome curto da obra - Assunto".
Exemplo: "Contrato 012/2026 - Escola Estadual X - Medição 07".

IT-DOB-SEI-11 Painel de Controle para quem gerencia ([telas](#))

1. Menu principal, **Painel de Controle**, botão **Configurar**.
2. Marque: Processos abertos, Controles de Prazos, Retornos Programados, Blocos de Assinatura abertos, Marcadores em processos e Atribuição de processos. **Salvar**.
3. O painel mostra numa tela só quantos processos estão com cada pessoa, em cada marcador, e quais prazos estão vencidos. É a tela da reunião semanal de coordenação.
4. Opcional: definir o Painel como página inicial, nas configurações do próprio painel.

IT-DOB-SEI-12 Iniciar um processo novo ([telas](#))

Antes de abrir processo novo, pesquise se já existe um sobre o mesmo assunto. Medição, aditivo e penalidade de um contrato nascem como processos relacionados ao processo do contrato, não como processos soltos.

1. No menu principal, à esquerda, clique em **Iniciar Processo**.
2. Aparecem os tipos já usados pela unidade. Para ver todos, clique no **sinal de mais verde** ao lado de "Escolha o Tipo do Processo" e digite uma palavra no campo de busca.
3. Clique no tipo desejado. Abre a tela de cadastro.
4. **Especificação:** siga o padrão da DOB: "Contrato no/ano - Nome curto da obra - Assunto".

5. **Classificação por Assuntos:** já vem preenchida. Não altere.
6. **Interessados:** digite o nome da contratada e do órgão cliente e selecione na lista.
7. **Observações desta unidade:** palavras que ajudem a achar depois (nome do fiscal, município, número do empenho).
8. **Nível de Acesso:** **Público** como regra. **Restrito** só com hipótese legal escolhida na lista (documento preparatório, informação pessoal). Sigiloso não se usa na rotina da DOB.
9. Clique em **Salvar**. O processo abre, já com número, pronto para receber documentos.

IT-DOB-SEI-13 Assinar documento da própria unidade ([telas](#))

SEI-RJ **EMOP/DOB** [Usuário](#) | [Sair](#)

Assinatura de Documento

Assinatura de Documento

Órgão do Assinante:
EMOP ▼

Assinante: 1
Nome Completo do Usuário Logado

Cargo / Função: 2
Gerente ▼

Senha: 3
.....

Assinar 4

[ou Certificado Digital](#)

1 Confira se é o SEU nome. Assinatura é pessoal e intransferível
2 Escolha o cargo correto (quem tem mais de um precisa conferir sempre)
3 Mesma senha do login
4 Assinar (ou tecle Enter). Em bloco, assina todos os documentos de uma vez

Tela esquemática para treinamento — ilustra a posição dos campos e botões; a tela real do SEI-RJ pode ter pequenas diferenças.

1. Na árvore do processo, clique no documento. Leia o texto inteiro no painel da direita.
2. Na barra de ícones, clique em **Assinar Documento** (caneta).
3. Na janela que abre, confira seu nome em **Assinante**, escolha o **Cargo/Função** correto na lista, digite a **Senha** (a mesma do login) e tecle **Enter** ou clique em **Assinar**.
4. Confira: aparece uma caneta ao lado do documento na árvore e a tarja de assinatura no rodapé do texto.
5. Mais de uma pessoa da mesma unidade pode assinar o mesmo documento: cada uma repete os passos 2 e 3.
6. Caneta amarela: ainda dá para editar. Caneta preta: outra unidade já viu; não edita mais.

Cuidado: assinatura é pessoal e intransferível. Ninguém assina com a senha do chefe. Para o chefe assinar, use o bloco (IT-DOB-SEI-06).

IT-DOB-SEI-14 Dar ciência e comentar ([telas](#))

Recurso	Para quê	Entra na instrução do processo?
Ciência	Registrar que você tomou conhecimento de um documento, sem precisar escrever despacho	Sim, fica registrado com nome, data e hora
Comentário	Observação sobre um documento, visível a quem acessa o processo	Não é peça do processo, mas outras unidades veem
Anotação	Lembrete interno da unidade	Não; só a unidade vê

1. **Ciência:** clique no documento na árvore e, na barra de ícones, em **Ciência** (mão com polegar). Aparece o ícone ao lado do documento; clicando nele, vê-se a lista de quem deu ciência.
2. **Comentário:** clique no documento, ícone **Comentários** (balão). Escreva e **Salvar**.
3. Use Ciência quando o despacho seria só "Ciente. Arquive-se." Economiza um documento e uma assinatura.

IT-DOB-SEI-15 Relacionar, anexar e sobrestar ([telas](#))

Recurso	O que faz	Quando usar na DOB	Desfaz?
Relacionar	Liga dois processos, que continuam independentes	Medições, aditivos e penalidades ligados ao processo do contrato	Sim
Anexar	Junta um processo dentro de outro, de forma definitiva	Processos duplicados sobre o mesmo pedido	Só pelo administrador
Sobrestar	Congela o processo enquanto espera decisão de fora	Aguardando decisão judicial ou de outro processo	Sim

1. **Iniciar já relacionado (melhor forma):** abra o processo do contrato, clique no ícone **Iniciar Processo Relacionado**, escolha o tipo e cadastre como na IT-12. O vínculo nasce pronto.
2. **Relacionar processos existentes:** abra um deles, ícone **Relacionamentos do Processo**. Em **Processo Destino**, digite o número do outro, clique em **Pesquisar** e depois em **Adicionar**.

- Os relacionados aparecem no canto inferior esquerdo da tela do processo. Um clique abre.
- Anexar:** abra o processo principal, ícone **Anexar Processo**, digite o número do acessório, **Pesquisar, Anexar**. O acessório precisa estar aberto só na sua unidade. Pense duas vezes: não tem volta simples.
- Sobrestar:** ícone **Sobrestar Processo**. Escolha **Somente sobrestar** ou **Sobrestar vinculando a outro processo**, escreva o **Motivo, Salvar**. Para retomar: Menu, **Processos Sobrestados**, ícone **Remover Sobrestamento**.

IT-DOB-SEI-16 Gerar PDF, baixar o processo e enviar por e-mail ([telas](#))

- PDF do processo:** com o processo aberto, ícone **Gerar Arquivo PDF do Processo**. Marque os documentos desejados (ou todos) e clique em **Gerar**.
- PDF de um documento só:** clique no documento e use o mesmo ícone na barra dele.
- Baixar com os anexos originais (planilhas, fotos):** ícone **Gerar Arquivo ZIP do Processo**.
- Enviar por e-mail de dentro do SEI:** ícone **Enviar Correspondência Eletrônica**. Preencha **De** (e-mail da unidade), **Para, Assunto e Mensagem** (pode usar Texto Padrão). Em **Documentos do processo**, marque os que seguem anexos. **Enviar**. O e-mail vira documento na árvore, como prova do envio.
- Use o e-mail do SEI para notificar contratada e órgão cliente: fica registrado no processo com data e hora.

IT-DOB-SEI-17 Bloco interno e bloco de reunião ([telas](#))

Bloco	Serve para	Quem vê
Assinatura	Colher assinatura de outra pessoa ou unidade (IT-06)	Origem e destino
Interno	Pasta de processos da unidade, por assunto	Só a unidade
Reunião	Mostrar processos a outra unidade para discussão, sem tramitar	Origem e unidades convidadas

- Bloco de reunião para a coordenação semanal:** Menu, **Blocos, Reunião, Novo**. **Descrição:** "Coordenação DOB - semana 38". Em **Unidades para Disponibilização**, inclua as 4 COBRAs. **Salvar**.
- Em cada processo da pauta, ícone **Incluir em Bloco**, escolha o bloco de reunião.
- Na lista de blocos, clique em **Disponibilizar Bloco**. Os Coordenadores abrem os processos pelo bloco, inclusive as minutas ainda não assinadas, sem que o processo saia da DOB.

- Depois da reunião, **Cancelar Disponibilização**, retire os processos e **Concluir Bloco**.
- Bloco interno:** mesmo caminho, em **Blocos, Interno**. Sugestão: um bloco "Órgãos de controle - em aberto" e um "Aditivos em curso".

IT-DOB-SEI-18 Dar vista do processo a quem é de fora ([telas](#))

Use quando a contratada pede vista para se defender (POP-DOB-07) ou o órgão cliente precisa acompanhar.

- Com o processo aberto, ícone **Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo**.
- E-mail da Unidade:** escolha o da sua unidade.
- Destinatário:** nome e **E-mail do Destinatário**.
- Motivo:** "Vista para defesa prévia, notificação no 00/2026".
- Tipo:** **Acompanhamento integral do processo** ou **Disponibilização de documentos** (escolhe quais).
- Validade (dias):** o prazo da defesa mais uma folga.
- Digite sua **Senha** e clique em **Disponibilizar**. O destinatário recebe um link por e-mail.
- O mesmo ícone mostra a lista de acessos concedidos e permite cancelar.

6.5 Tipos de processo

O tipo de processo define classificação arquivística e prazo de guarda; não se escolhe "qualquer um". **[VALIDAR]** com o ponto focal do SEI na EMOP a lista de tipos habilitados para medição, aditivo, penalidade, recebimento e resposta a órgão de controle, e fixar aqui uma tabela "assunto da DOB, tipo de processo a usar".

7. Indicadores, controles e segregação de funções

Nove indicadores bastam para o Diretor enxergar a Diretoria numa página por mês. Eles unificam as listas dos rascunhos V3 e V5, que tinham metas diferentes para o mesmo indicador. As metas são ponto de partida **[VALIDAR]**; o primeiro trimestre serve para medir a linha de base.

Indicador	Como medir	Meta inicial	Fonte do dado	Quem apura
Prazo da medição dentro da DOB	Dias úteis entre o fechamento do período e o envio à DAF	até 10 dias úteis	Andamento no SEI	Assessoria

Indicador	Como medir	Meta inicial	Fonte do dado	Quem apura
Instrução de aditivo	Dias úteis entre o pedido formal e o envio da minuta à ASJUR	até 15 dias úteis (V3)	Andamento no SEI	Assessoria
Ciclo completo do aditivo	Dias corridos entre o pedido e a assinatura final	até 45 dias (V5)	Andamento no SEI	Assessoria
Aditivos de prazo assinados antes do vencimento	Assinados no prazo dividido pelo total	100%	Planilha de prazos	Assessoria
Aderência ao cronograma (IDP)	Valor medido acumulado dividido pelo valor previsto acumulado, por obra	acima de 0,90 (V5)	Medições	Coordenador
Desvio de custo	Valor final com aditivos dividido pelo valor inicial, por obra	acompanhar; limite legal de 1,25, ou 1,50 em reforma	Controle de contratos	Assessoria
Sistemas de controle em dia	Contratos e aditivos lançados no prazo dividido pelo total	100% (V3)	SGP e sistemas do TCE-RJ	Assessoria
Caixa SEI saudável	Processos sem atribuição ou parados há mais de 15 dias na unidade	zero	Painel de Controle e Estatísticas do SEI	Cada chefe de unidade
Cobertura de substitutos	Rotinas com substituto treinado dividido pelo total de rotinas	100% (V3)	Quadro de substitutos	Assessoria

Segregação de funções. A área de conformidade da EMOP verifica esse princípio (ES art. 72, IV). Na DOB ele se traduz em quatro regras:

- Quem elaborou o orçamento de referência não fiscaliza a mesma obra.
- Quem mede (fiscal) não é quem atesta em segunda linha (Gerente e Coordenador), e nenhum deles liquida ou paga (DAF).
- Quem propõe o aditivo (Gerente e Coordenador) não é quem emite o parecer (ASJUR) nem quem autoriza (Presidência).
- Quem propõe a penalidade não é quem decide o recurso.

Controles que a Assessoria mantém, todos citados no Regimento: fluxo de medições e aditivos; saldo de empenho por obra; PDs; garantias contratuais; prazos contratuais; entrega de documentos pela fiscalização; desempenho das contratadas; viaturas e inventário; frequência. Recomenda-se uma única planilha-mestra de obras (ou o SGP, se comportar) em vez de planilhas separadas, para que o relatório mensal saia dela sem retrabalho.

8. Pontos a validar e fontes

Esta minuta tem 12 pontos que só a EMOP pode confirmar. Resolvidos esses pontos, o texto pode ir à aprovação do Diretor e à publicação no BOE.

- ☐ Estrutura real: a "Gerência Técnica Administrativa" dos rascunhos é a Assessoria do Regimento? O Gerente de Obras responde ao Coordenador (como no Regimento) ou direto ao Diretor?
- ☐ Há Regimento Interno posterior a abril de 2018, ou ato que tenha alterado a estrutura da DOB?
- ☐ Texto integral do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP, em especial arts. 213 a 216 (comissão de fiscalização), regras de recebimento, penalidades e certidões exigidas na medição.
- ☐ Versão vigente do Manual de Fiscalização da EMOP e dos formulários (boletim de medição, mapa de tempo, Caderneta do Fiscal).
- ☐ Significado e modelo de RIPM e de BCO.
- ☐ Como as unidades estão configuradas no SEI-RJ: DOB, cada COBRA e cada DOBRA têm caixa própria? O Diretor tem acesso a quais?
- ☐ Tipos de processo do SEI usados para medição, aditivo, penalidade, recebimento e órgãos de controle.
- ☐ Quais remessas ao TCE-RJ (SIGFIS e e-TCERJ) cabem à DOB e quais à DAF ou à Auditoria, e em que prazo.
- ☐ O que o SGP exige da DOB e com que frequência.

- ☐ Autoridade competente para aplicar multa e decidir recurso.
- ☐ Datas do calendário mensal (Seção 4.3) compatíveis com o calendário de pagamentos da DAF.
- ☐ Metas dos indicadores (Seção 7).

Imagens das telas do SEI. As nove telas da Seção 6 são desenhos esquemáticos: mostram a posição dos campos e botões e numeram onde clicar, mas não são capturas do sistema, porque o ambiente em que este documento foi montado não acessa o SEI da EMOP nem baixa as imagens do manual oficial. Para a versão final, recomenda-se trocá-las por capturas reais: alguém da Diretoria segue cada instrução em um processo de teste, captura a tela a cada passo e envia as imagens, que entram no mesmo lugar, com a mesma numeração. Vantagem: aparecem as unidades, os tipos de processo e os modelos da própria EMOP. Cuidado: usar processo de teste ou tarjar nomes e números. Até lá, o link "telas" de cada instrução abre as capturas oficiais do manual do SEI-RJ.

Fontes consultadas

Fonte	Usada para
Estatuto Social da EMOP, consolidado em 03/07/2019 (arquivo enviado)	Competências do Diretor, regras de assinatura, conformidade
Regimento Interno da EMOP, abril de 2018 (arquivo enviado)	Estrutura, atribuições de Diretor, Coordenador, Gerente, Assessor e Assistentes
Decreto estadual 46.188/2017 (arquivo enviado)	Transparência, controle, metas da Diretoria
Lei 6.404/1976 (arquivo enviado) e Lei 13.303/2016	Deveres do administrador; alteração contratual e penalidades
Manual de Rotinas da DOB, V3, e Documento Consolidado, V5 (arquivos enviados)	Rotinas já praticadas, ordem de assinaturas, processos-modelo, indicadores
Manual do Usuário Interno do SEI-RJ	Toda a Seção 6
Portal SEI-RJ, manuais e POPs	Modelo de POP por operação
Manual federal do SEI, Blocos	Sinalizações e atribuição de bloco de assinatura
Boletim de Serviço EMOP 783, de 01/12/2023	Prática de designação das comissões de gestão e fiscalização
TJRJ, RAD-SGLOG-084, Medir serviços em contratos de obras	Estrutura de rotina, papéis na medição, lista de documentos

Fonte	Usada para
TCU, Obras públicas: recomendações básicas	Boas práticas de fiscalização, medição, aditivos e as built
TCU, Licitações e Contratos, fiscalização técnica e recebimento provisório	Registro de ocorrências e comunicação ao superior
CGU, Manual de Auditoria de Obras Públicas	O que a auditoria procura na rotina de fiscalização
TCE-RJ, dúvidas frequentes do SIGFIS	Cadastro de contratos e aditivos nos informes mensais
Caltrans Construction Manual	Organização por função, formulários numerados, controle de revisões

Anexo A. Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Cada POP é um documento autônomo, em folha própria, com código, versão e campos de elaboração e aprovação. Pode ser impresso, revisado e publicado no BOE isoladamente, sem mexer no corpo do manual. A visão geral e o índice estão na Seção 5.

POP-DOB-01 Receber contrato novo e preparar a obra

Gatilho: contrato assinado chega à DOB pelo SEI. **Conduz:** Assessoria, com o Coordenador da área.

1. Assessoria confere se o processo traz contrato assinado, publicação do extrato, nota de empenho, planilha contratual, cronograma físico-financeiro e garantia contratual. Faltou algo: devolve à unidade de origem com despacho dizendo o que falta.
2. Assessoria cadastra a obra nos controles da DOB (código de obra, boletim de cadastro, SGP) **[VALIDAR]** e inclui o processo no Acompanhamento Especial da obra no SEI (IT-DOB-SEI-03).
3. Diretor define, com os Coordenadores, a COBRA e o DOBRA responsáveis e os nomes da comissão de gestão e fiscalização (RI Subseção I, XXIX).
4. Diretor assina despacho de indicação e envia à Presidência para a portaria de designação (RLC arts. 213 a 216).
5. Assessoria acompanha a publicação da portaria no Boletim de Serviço e junta cópia ao processo.
6. Processo segue à COBRA, que atribui ao Gerente.

Saída: obra cadastrada, comissão designada e publicada, processo na caixa do Gerente.

Atenção: sem portaria publicada não há fiscal; sem fiscal não há início.

POP-DOB-02 Emitir Memorando de Início

Gatilho: POP-01 concluído. **Conduz:** Gerente (RI Subseção II, XII), sob controle do Coordenador (Subseção I, XIII).

1. Gerente confere os pré-requisitos com o checklist de início:
 - contrato assinado e extrato publicado;
 - nota de empenho emitida, com saldo para ao menos as primeiras medições;
 - portaria da comissão publicada;
 - garantia contratual apresentada e aceita;
 - ART ou RRT de execução e indicação do responsável técnico da contratada;
 - local liberado pelo órgão cliente, com data combinada por escrito;
 - projeto e planilha na versão contratada em poder da fiscalização;
 - licenças e autorizações exigíveis (ambiental, patrimônio histórico INEPAC ou IPHAN, concessionárias), quando o objeto exigir.
2. Gerente faz reunião de partida com a contratada e o representante do órgão cliente. Registra em ata: cronograma, frentes, horários, canteiro, segurança, canal de comunicação.
3. Gerente gera o Memorando de Início no SEI, a partir do modelo salvo em Favoritos (IT-DOB-SEI-04), e assina.
4. Coordenador dá o visto. Assessoria registra a data de início nos controles e calcula a data final do prazo de execução.
5. Assessoria pede à área de TI a liberação do cadastro da obra para o fiscal nos sistemas internos (rascunho V3).

Saída: memorando assinado, data de início e data final registradas. **Atenção:** a data do memorando é a base de todos os prazos e da periodicidade de medição; erro aqui contamina o contrato inteiro.

POP-DOB-03 Fiscalizar a obra

Gatilho: Memorando de Início. **Conduz:** comissão de fiscalização, supervisionada pelo Gerente.

1. Fiscal visita a obra conforme o plano de visitas definido com o Gerente na partida.
2. A cada visita, registra no Diário de Obras: data, clima, efetivo, equipamentos, serviços em execução, ocorrências e determinações. O diário é assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.
3. Confere a execução contra projeto, especificações, Catálogo de Referência da EMOP, recomendações dos fabricantes e normas ABNT (RI Subseção II, IV).

4. Exige os ensaios de controle tecnológico previstos e arquiva os laudos. Resultado fora da especificação gera notificação e o serviço não entra na medição até ser corrigido.
5. Confere as condições de segurança do trabalho no canteiro. Risco grave e iminente é comunicado na hora ao Gerente e à contratada, por escrito.
6. Tudo que exceder a competência do fiscal (alteração de projeto, prazo, custo) sobe ao Gerente por escrito no mesmo dia. Fiscal não autoriza serviço extra verbalmente.
7. Gerente faz reunião periódica de obra, com ata, e atualiza o programa de execução e a liberação de frentes com o órgão cliente.
8. Fiscal lança os dados na Caderneta do Fiscal; a Assessoria confere toda semana (RI Subseção III, XV).

Saída: Diário em dia, laudos arquivados, atas de reunião, ocorrências comunicadas.

Atenção: o Diário de Obras é a principal prova da EMOP em qualquer disputa, multa ou auditoria.

POP-DOB-04 Medição mensal

Gatilho: fechamento do período de medição previsto no contrato. **Conduz:** fiscal elabora, Gerente atesta, Coordenador visa, Diretor encaminha.




1. Fiscal levanta em campo, com o preposto da contratada, as quantidades executadas no período. Só entra o que está executado, conforme e aceito.
2. Fiscal monta o boletim de medição com os anexos exigidos pelo Regimento: memória de cálculo, relatório fotográfico datado e mapa de tempo. Inclui o cronograma físico-financeiro atualizado, com o previsto e o realizado.
3. Contratada dá o "de acordo" na medição e apresenta nota fiscal e certidões de regularidade exigidas no contrato **[VALIDAR]** lista de certidões conforme o RLC.
4. Fiscal inclui tudo no processo de medição no SEI como documentos externos, na ordem do checklist de medição, e assina o boletim.
5. Gerente confere quantidades contra a memória, preços contra a planilha contratual, acumulado contra o saldo do contrato, e atesta (RI Subseção II, XX).
6. Coordenador confere por amostragem, avalia o avanço contra o cronograma e visa (RI Subseção I, XXIII). Se for a última medição, confere os 10% mínimos e a existência do Termo de Recebimento Provisório (XVII).
7. Assessoria confere o saldo de empenho. Saldo insuficiente: aciona o reforço antes de enviar à DAF (RI Subseção III, X).
8. Diretor assina o despacho de encaminhamento à DAF para liquidação e pagamento.

9. Assessoria registra a medição nos controles e acompanha a PD até o pagamento (RI Subseção III, XXVI).

Saída: medição atestada e paga, controles atualizados. **Atenção:** quem mede não é o mesmo que confere e quem confere não é o mesmo que paga; é a segregação de funções exigida pelo Estatuto (art. 72, IV). Sugestão de regra interna [VALIDAR]: medição com avanço acumulado mais de 20% abaixo do cronograma obriga o Coordenador a registrar a causa e a providência.

POP-DOB-05 Aditivos: prazo, quantidades e serviços novos

Gatilho: fiscal, contratada ou órgão cliente aponta necessidade de alterar prazo, quantidade ou incluir serviço. **Conduz:** Gerente instrui, Coordenador justifica, Assessoria monta a minuta, Diretor decide o encaminhamento.

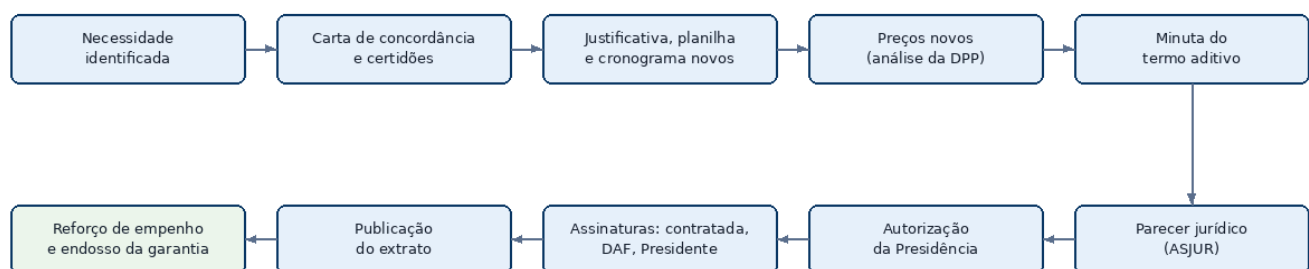

1. Gerente abre a instrução no processo do contrato (ou em processo relacionado) e descreve o fato: o que mudou, por que não era previsível, qual o impacto em prazo e custo.
2. Como os contratos da Lei 13.303/2016 só se alteram por acordo entre as partes, o Gerente obtém da contratada a carta de concordância, as certidões válidas e o cronograma reprogramado.
3. Gerente e fiscal montam a planilha comparativa (contratado, acréscimos, supressões, final) e o relatório de instrução da modificação (RIPM) [VALIDAR] nome e modelo.
4. Havendo serviço sem preço na planilha contratual, o processo vai à DPP para composição do preço, mantido o desconto da licitação.
5. Coordenador redige a justificativa técnica e confere os limites legais de acréscimo: 25% do valor atualizado do contrato, ou 50% em reforma de edifício, só para acréscimos (Lei 13.303/2016, art. 81). Acréscimos e supressões são calculados em separado, sem compensação.
6. Assessoria monta a minuta do termo aditivo com o modelo oficial. O rascunho V3 cita como referência os processos SEI-170002/000926/2022, SEI-170002/002498/2021 e SEI-170002/000291/2023.
7. Diretor decide o encaminhamento e envia à ASJUR para parecer.

8. Com parecer favorável, segue à Presidência para autorização.
9. Assinaturas na ordem: primeiro a contratada (usuário externo no SEI), depois o Diretor de Administração e Finanças, por último o Diretor-Presidente (rascunhos V3 e V5; ES art. 40, XII).
10. Assessoria acompanha a publicação do extrato, junta ao processo, pede o reforço de empenho e o endosso da garantia, e atualiza prazos e valores em todos os controles.

Saída: termo aditivo assinado e publicado, empenho e garantia ajustados, controles atualizados. **Atenção:** aditivo de prazo tem de estar assinado antes do vencimento do prazo vigente; contrato vencido não se prorroga. A planilha de prazos semanal (Seção 4.2) existe para isso. Nenhum serviço novo começa antes do aditivo assinado.

POP-DOB-06 Paralisação e reinício

Gatilho: fato que impede a continuidade (falta de frente, de recurso, embargo, chuva excepcional, decisão do cliente). **Conduz:** Gerente, com controle do Coordenador.

1. Fiscal registra o fato no Diário e comunica o Gerente por escrito.
2. Gerente formaliza a paralisação com data e motivo, comunica a contratada e o órgão cliente, e pede à contratada as medidas de proteção do que já foi executado.
3. Assessoria registra a situação "paralisada" nos controles e sistemas.
4. Para reiniciar, o Gerente confere: causa superada, empenho suficiente, carta de concordância da contratada, certidões atualizadas e cronograma reprogramado (rascunho V3).
5. Se a paralisação consumiu prazo, o aditivo de prazo (POP-05) corre junto.
6. Gerente expede o Memorando de Reinício; Coordenador visa; Assessoria atualiza as datas.

Saída: paralisação e reinício formalizados, prazos recalculados. **Atenção:** obra parada sem ato formal continua consumindo prazo contratual.

POP-DOB-07 Penalidades

Gatilho: descumprimento contratual registrado no Diário ou em relatório. **Conduz:** fiscal notifica; Gerente aplica advertência e propõe multa (RI Subseção II, XVI); Coordenador acompanha (Subseção I, XVI).

1. Fiscal notifica a contratada por escrito, descrevendo o descumprimento, a cláusula violada e o prazo para corrigir.
2. Não corrigido no prazo, o Gerente abre a instrução com as provas: Diário, fotos, notificações, atas.

3. A contratada é intimada para defesa prévia, no prazo de 10 dias úteis (Lei 13.303/2016, art. 83, § 2o).
4. Gerente analisa a defesa e propõe advertência ou multa, com o cálculo conforme o contrato.
5. Coordenador se manifesta; Diretor encaminha à ASJUR e à autoridade competente para decidir **[VALIDAR]** competência conforme o RLC.
6. Assessoria registra a penalidade na ficha de desempenho da contratada.

Saída: decisão motivada, com contraditório garantido. **Atenção:** penalidade sem notificação prévia e sem prazo de defesa é anulada depois.

POP-DOB-08 Recebimento provisório, definitivo e encerramento

Gatilho: contratada comunica por escrito a conclusão da obra. **Conduz:** Gerente (RI Subseção II, XXVI).

1. Fiscal e Gerente vistoriam a obra com a contratada e o órgão cliente e listam as pendências.
2. Sem pendência impeditiva, lavra-se o Termo de Recebimento Provisório, com a lista de pendências e o prazo para saná-las.
3. Só então a última medição é autorizada (mínimo de 10% do valor do contrato).
4. Gerente recolhe o acervo: as built, manuais, garantias de equipamentos, documentos de manutenção (RI Subseção II, XXI).
5. Decorrido o prazo de observação previsto no contrato **[VALIDAR]** prazo conforme o RLC, e sanadas as pendências, lavra-se o Termo de Recebimento Definitivo, assinado conforme a regra do RLC.
6. Gerente envia ao Coordenador os dados finais: orçamento inicial, cronograma, modificações, aditivos, prazo real, acumulado medido e as built (Subseção II, XXII).
7. Coordenador analisa, envia o acervo ao órgão cliente e o dossiê à Assessoria (Subseção I, XXIV).
8. Assessoria consolida e o Diretor encaminha à DPP o documento de encerramento, com a análise das diferenças entre o planejado e o executado (RI, VI; Subseção III, XIV).
9. Assessoria pede à DAF a liberação da garantia, atualiza a situação para "concluída" nos sistemas e arquiva a pasta da obra.

Saída: termos lavrados, acervo entregue, dossiê na DPP, garantia liberada. **Atenção:** o recebimento não encerra a responsabilidade da contratada pela solidez e segurança da obra; defeitos surgidos depois são notificados e tratados em processo próprio.

POP-DOB-09 Responder a órgãos de controle

Gatilho: ofício, citação ou diligência de TCE, TCU, MP, CGU, Auditoria Geral ou Auditoria Interna. **Conduz:** Assessoria coordena; Gerente e Coordenador produzem o conteúdo técnico.

1. Assessoria registra o prazo no mesmo dia, cria Controle de Prazo no SEI (IT-DOB-SEI-08) com data interna igual à metade do prazo do órgão, e avisa o Diretor.
2. Diretor define o responsável pela minuta.
3. Gerente e fiscal levantam documentos e fatos; Coordenador revisa (RI Subseção I, XXVI; Subseção II, XXIII).
4. Assessoria consolida a minuta e envia à ASJUR ou à AUDIT, conforme o caso.
5. Diretor assina o encaminhamento; a resposta externa sai pela autoridade competente.

Saída: resposta dentro do prazo, com cópia arquivada na pasta da obra. **Atenção:** pedido de prorrogação de prazo se faz antes do vencimento, nunca depois.

POP-DOB-10 Passagem de função

Gatilho: troca de fiscal, Gerente, Coordenador ou Assessor. **Conduz:** quem sai, com o superior imediato.

1. Quem sai prepara nota de passagem por obra: situação física e financeira, prazos que vencem em 60 dias, pendências, riscos, contatos.
2. Superior reatribui no SEI os processos de quem sai (IT-DOB-SEI-02) e confere blocos, acompanhamentos especiais e controles de prazo.
3. Troca de fiscal exige nova portaria (POP-01, passos 4 e 5) e registro no Diário de Obras.
4. Assessoria pede à área de TI a atualização dos acessos (SEI, SGP, e-mail, sistemas internos) e atualiza o quadro de substitutos.
5. Quem chega lê este manual, o contrato e o edital das obras que assume (RI Subseção II, I).

Saída: nenhuma obra sem responsável formal, nenhum processo atribuído a quem saiu.

Anexo B. Formulários: roteiro de chegada, checklists e modelos

São os formulários (FRM-DOB) citados nos POPs. Cada checklist vira um documento-modelo no SEI, salvo em Favoritos (IT-DOB-SEI-04), para ser preenchido e assinado dentro do processo. Os itens marcados [**VALIDAR**] dependem do RLC e do Manual de Fiscalização.

FRM-DOB-01 Roteiro de chegada: primeiro dia, primeira semana, primeiro mês

Primeiro dia

- ☐ Pedir ao ponto focal do SEI na EMOP o acesso às unidades em que vai atuar e conferir o Cargo/Função cadastrado para assinatura.
- ☐ Pedir acesso ao e-mail institucional, ao SGP e aos sistemas internos de obras.
- ☐ Entrar no SEI (IT-01), configurar o Painel de Controle (IT-11) e ler a Seção 6.1.
- ☐ Ler o quadro da sua função na Seção 3 e o calendário da Seção 4.
- ☐ Receber do antecessor ou do superior a nota de passagem (FRM-DOB-08).

Primeira semana

- ☐ Listar todas as obras sob sua responsabilidade, com fiscal, contratada, valor, início, fim do prazo e percentual medido.
- ☐ Ler edital e contrato de cada obra (é o inciso I das atribuições do Gerente e do Coordenador).
- ☐ Abrir cada processo no SEI, conferir atribuição, marcador e anotação (Seção 6.1, combinado 3).
- ☐ Montar ou conferir a planilha de prazos: o que vence em 30, 15 e 7 dias.
- ☐ Conhecer os fiscais e visitar as obras mais críticas.
- ☐ Participar da reunião de coordenação.

Primeiro mês

- ☐ Visitar todas as obras ao menos uma vez.
- ☐ Acompanhar um ciclo completo de medição (POP-DOB-04), do campo ao envio à DAF.
- ☐ Conferir garantias, ARTs e portarias de comissão de todas as obras.
- ☐ Entregar o primeiro Relatório Mensal de Obras.
- ☐ Registrar o que encontrou fora do padrão e propor correção ao superior.

FRM-DOB-02 Checklist de início de obra (POP-DOB-02)

No	Item	Onde está a prova
1	Contrato assinado por todas as partes	Documento no processo do contrato
2	Extrato do contrato publicado no Diário Oficial	Cópia da publicação
3	Nota de empenho emitida e com saldo	NE no processo
4	Portaria da comissão de gestão e fiscalização publicada	Boletim de Serviço

No	Item	Onde está a prova
5	Garantia contratual apresentada, conferida e dentro da validade	Apólice ou comprovante
6	ART ou RRT de execução registrada e paga	Documento do CREA ou CAU
7	Responsável técnico e preposto da contratada indicados por escrito	Carta da contratada
8	Local liberado pelo órgão cliente, com data	Ofício, e-mail ou ata
9	Projetos, especificações e planilha na versão contratada, entregues à fiscalização	Pasta da obra
10	Licenças e autorizações exigíveis obtidas	Documentos dos órgãos
11	Cronograma físico-financeiro aprovado	Documento no processo
12	Reunião de partida realizada, com ata	Ata
13	Diário de Obras aberto	Primeira folha
14	Placa de obra, canteiro e plano de segurança conferidos [VALIDAR]	Relatório fotográfico

Conferido por (Gerente), data. Visto (Coordenador), data.

FRM-DOB-03 Checklist de instrução da medição (POP-DOB-04)

Ordem dos documentos na árvore do processo; sempre a mesma, em todas as obras.

No	Documento	Quem produz	Conferir
1	Boletim de medição, com período e número	Fiscal	Soma, acumulado, saldo contratual
2	Memória de cálculo, item por item	Fiscal	Bate com o boletim e com o projeto
3	Relatório fotográfico datado, com legenda por serviço	Fiscal	Fotos do período, não de arquivo
4	Mapa de tempo (dias trabalhados, chuva, paralisações)	Fiscal	Bate com o Diário de Obras
5	Cronograma físico-financeiro atualizado, previsto e realizado	Fiscal e contratada	Percentual acumulado

No	Documento	Quem produz	Conferir
6	Folhas do Diário de Obras do período	Fiscal	Assinadas pelas duas partes
7	Laudos de ensaios do período, quando houver	Contratada	Dentro da especificação
8	De acordo da contratada com a medição	Contratada	Assinatura do representante
9	Nota fiscal	Contratada	Valor igual ao da medição; dados da EMOP corretos
10	Certidões de regularidade exigidas no contrato [VALIDAR]	Contratada	Validade na data do atesto
11	Atesto do Gerente	Gerente	Assinatura no SEI
12	Visto do Coordenador	Coordenador	Assinatura no SEI
13	Informação de saldo de empenho	Assessoria	Saldo cobre a medição
14	Despacho de encaminhamento à DAF	Diretor	Assinatura no SEI

Na última medição, acrescentar: Termo de Recebimento Provisório e conferência do mínimo de 10% do valor do contrato.

FRM-DOB-04 Checklist de instrução de aditivo (POP-DOB-05)

No	Item	Quem
1	Relato do fato e do motivo, com data em que foi identificado	Gerente
2	Carta de concordância da contratada	Contratada
3	Certidões de regularidade válidas	Contratada
4	Planilha comparativa: contratado, acréscimos, supressões, final	Gerente e fiscal
5	Cronograma físico-financeiro reprogramado	Contratada, aprovado pelo Gerente
6	Composição de preços dos serviços novos, com o desconto da licitação	DPP

No	Item	Quem
7	Cálculo dos percentuais de acréscimo e de supressão, em separado, sobre o valor atualizado	Coordenador
8	Justificativa técnica	Coordenador
9	Relatório de instrução da modificação [VALIDAR]	Gerente
10	Anuência do órgão cliente, quando o recurso for dele	Órgão cliente
11	Indicação da disponibilidade orçamentária	DAF
12	Minuta do termo aditivo no modelo oficial	Assessoria
13	Conferência da vigência: o prazo atual ainda não venceu	Assessoria
14	Despacho do Diretor à ASJUR	Diretor

Depois da assinatura: publicação do extrato, reforço de empenho, endosso da garantia, atualização dos controles e sistemas.

FRM-DOB-05 Checklist de recebimento (POP-DOB-08)

No	Item	Provisório	Definitivo
1	Comunicação escrita de conclusão pela contratada	Sim	
2	Vistoria conjunta: fiscal, Gerente, contratada e órgão cliente	Sim	Sim
3	Lista de pendências, com prazo	Sim	Todas sanadas
4	Testes de instalações (elétrica, hidráulica, incêndio, ar condicionado, elevadores)	Sim	
5	Limpeza final e desmobilização do canteiro	Sim	
6	As built em meio digital editável e em PDF	Sim	
7	Manuais, certificados e termos de garantia de equipamentos	Sim	
8	Documentos para manutenção entregues ao órgão cliente	Sim	

No	Item	Provisório	Definitivo
9	Baixa da ART e regularidade da obra perante INSS e prefeitura, quando couber [VALIDAR]		Sim
10	Dossiê de encerramento enviado ao Coordenador		Sim
11	Liberação da garantia contratual solicitada à DAF		Sim

FRM-DOB-06 Pauta fixa da reunião semanal de coordenação

Duração: 30 a 45 minutos. Tela de apoio: Painel de Controle do SEI (IT-11) e planilha de prazos.

1. Pendências da ata anterior (5 min).
2. Prazos que vencem em 30, 15 e 7 dias: vigência, execução, garantias, respostas a órgãos de controle (10 min).
3. Medições: o que entrou, o que está parado e onde (5 min).
4. Aditivos e penalidades em curso: fase de cada um (10 min).
5. Obras em alerta: atraso acima do limite, paralisadas, sem saldo de empenho (10 min).
6. Encaminhamentos: o quê, quem, até quando (5 min).

A ata tem só o item 6, em forma de tabela, e entra no processo de gestão da DOB no mesmo dia.

FRM-DOB-07 Modelo de resumo para despacho do Diretor

Vai no **Comentário** do bloco de assinatura (IT-06, passo 4). Três linhas por documento, sem adjetivo:

PROCESSO: SEI-170002/000000/2026 - Contrato 012/2026 - Escola X
O QUE É: encaminha a medição 07 (R\$ 412.300,00; acumulado 58%; cronograma previa 61%)
O QUE SE PEDE: assinar despacho à DAF. Conferido por: Gerente 3o DOBRA e Coord. 2a COBRA
ATENÇÃO: saldo de empenho cobre só mais uma medição; reforço já solicitado

FRM-DOB-08 Nota de passagem de função (POP-DOB-10)

Uma página por obra.

Campo	Conteúdo
Obra, contrato e processo SEI	

Campo	Conteúdo
Contratada, preposto e telefone	
Órgão cliente e contato	
Fiscal e portaria	
Valor inicial, aditivos e valor atual	
Início, prazo e data final vigente	
Percentual físico e financeiro medido; última medição	
Saldo de empenho	
Garantia: tipo e validade	
Prazos que vencem nos próximos 60 dias	
Pendências em aberto e com quem estão	
Riscos e pontos de atenção	
Onde está a pasta da obra (rede e SEI)	

FRM-DOB-09 Quadro de titulares e substitutos

Mantido pela Assessoria, revisto a cada trimestre e sempre que houver troca. Fica fora do corpo do manual para que mudança de pessoas não exija nova publicação.

Rotina	Titular	Substituto	Acesso a sistemas conferido em
Triagem SEI da DOB e fila de assinatura			
SGP e sistemas de controle externo			
Saldo de empenho, PDs e garantias			
Minutas de aditivo			
Cadastro de obras			
Relatório mensal			
Escala de férias e frequência			
Planilha de prazos			
